



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

PARECER TÉCNICO DE SOLICITAÇÃO DE 1º ADITIVO DE PRAZO
DE CONTRATO.

Solicitamos aditivo referente ao **AO CONTRATO Nº195/2023 – PMJ/ R DA SILVA SANTOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA**, prazo de **CONTRATO** para a data: 03/08/2023 (90 dias a contar do fim do prazo de contrato 03/05/23).

A contratada apresentou uma solicitação de prorrogação de prazo de contrato no dia 17/04/2023, onde foi relatado que a mesma teve dificuldades no andamento da obra dentre elas: dificuldade na entrega de materiais em decorrência da falta no município, e pela dificuldade na mobilização dos mesmo de outra cidade para Jacareacanga no periodo de chuva, onde a estrada fica com o trafego debilitado e podemos dizer até que perigoso.

PRAZO ADITIVADO → 90 DIAS (03/05/23 À 03/08/23)

Diante deste pressuposto, somos favoráveis ao aditivo de prazo de contrato, sendo este alterado para **data final 03/08/2023** (90 dias a contar do fim do prazo de contrato 03/05/23).

Segue anexo a este relatório fotográfico do estado atual da obra que se encontra em execução


MARILENE DE SOUZA RODRIGUES

ENG^ª. CIVIL CREA-PA: 041970951-7
ESP. T^ÉC. PELA FISCALIZAÇÃO



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34


**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE AO CONTRATO Nº Nº195/2023 –
PMJ/ R DA SILVA SANTOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA REFORMA DA ESCOLA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE
JACAREACANGA-PA.**

Ordem das Fotos	Registros Fotográficos
<p><i>Imagem 1 – vista externa.</i></p>	



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

Imagem 2 – primeira demão de pintura já executado.

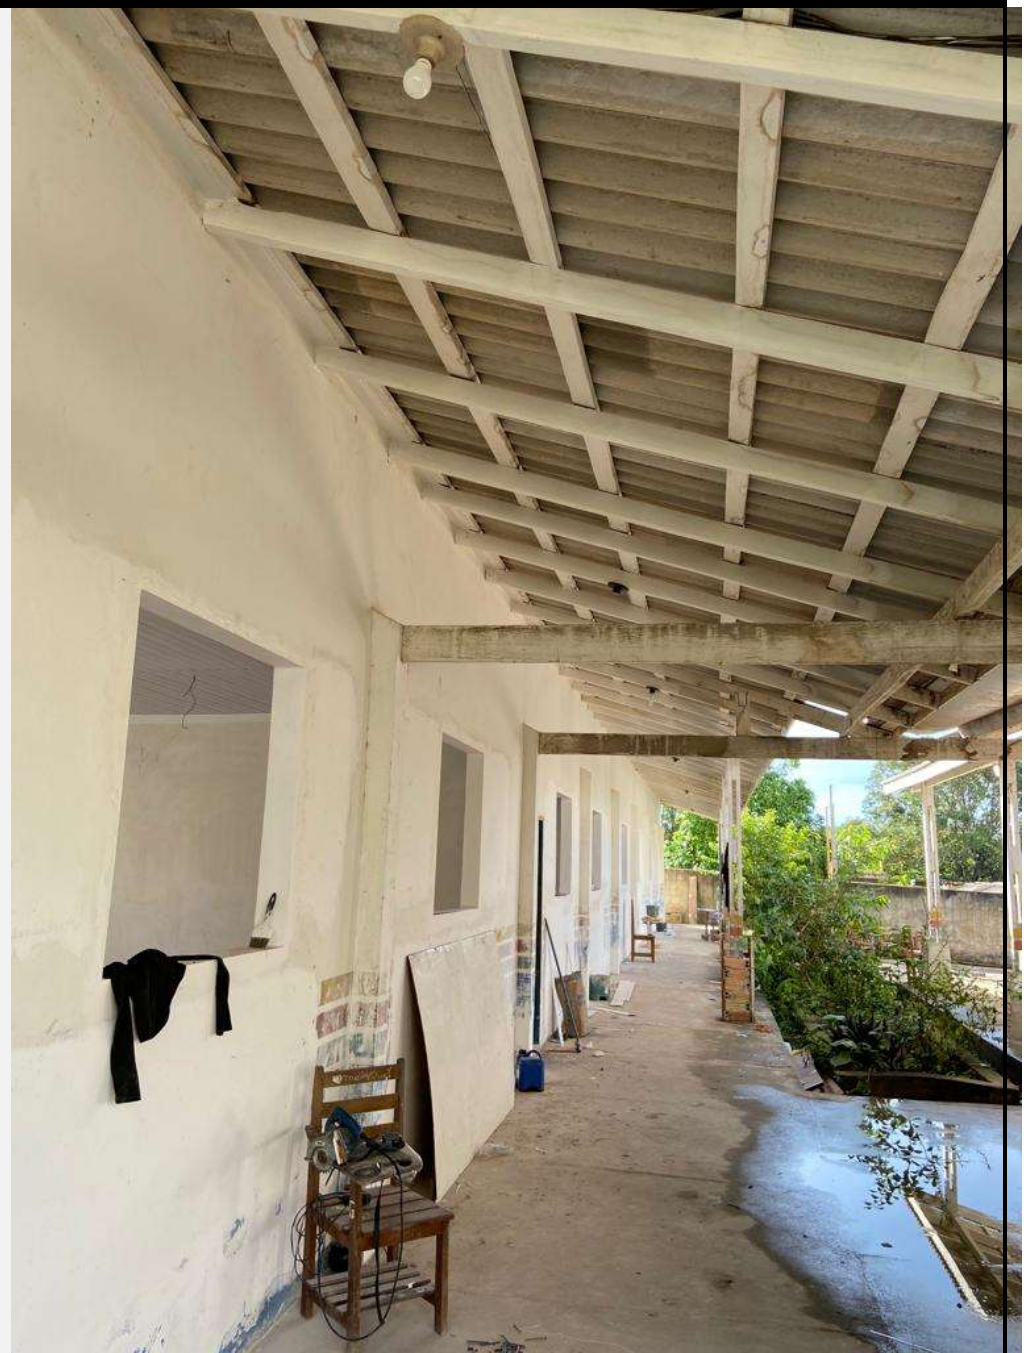



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

Imagem 3– instalação de forro.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

Imagem 4– primeira demão de pintura já executado.



Imagem 5– acesso aos banheiros.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

Imagem 6– serviço de pintura.



MARILENE DE SOUZA RODRIGUES

ENG^ª. CIVIL CREA-PA: 041970951-7
ESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
